Nr.	Vorgangsmodus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1		**Projekt Schnappi**	**56 Tage?**	**Mit 19.05.21**	**Mit 04.08.21**	
2		**Vorbereitung**	**5 Tage**	**Mit 19.05.21**	**Mit 26.05.21**	
3		Projektplan erstellen	2 Tage	Mit 19.05.21	Don 20.05.21	
4		Abgabe Projektplan 1	0 Tage	Fre 21.05.21	Fre 21.05.21	3
5		Projektplan überarbeiten	2 Tage	Mon 24.05.21	Die 25.05.21	4
6		Abgabe Projektplan 2	0 Tage	Mit 26.05.21	Mit 26.05.21	5
7		**Baugruppenentwicklung**	**44 Tage**	**Don 27.05.21**	**Mit 28.07.21**	**6**
8		**Muss-Funktionen**	**16 Tage**	**Don 27.05.21**	**Fre 18.06.21**	
9		Gesichtserkennung	9 Tage	Don 27.05.21	Die 08.06.21	
10		Positionserfassung Mitspielender	4 Tage	Mit 09.06.21	Mon 14.06.21	9
11		Grundgerüst	6 Tage	Don 27.05.21	Don 03.06.21	
12		Fortbewegung und Orientierung im Raum	7 Tage	Fre 04.06.21	Mon 14.06.21	11
13		Zeitpuffer und Endmontage Muss-Funktionen	3 Tage	Die 15.06.21	Don 17.06.21	10;12
14		Muss-Funktionen implementiert	0 Tage	Fre 18.06.21	Fre 18.06.21	13
15		**Soll-Funktionen**	**13 Tage**	**Mon 21.06.21**	**Don 08.07.21**	**14**
16		Position der Krokodilzähne erkennen	9 Tage	Mon 21.06.21	Don 01.07.21	
17		Status des Krokodilmauls erkennen	4 Tage	Mon 21.06.21	Don 24.06.21	
18		Öffnungsmechanismus für das Krokodilmaul	5 Tage	Fre 25.06.21	Don 01.07.21	17
19		Zeitpuffer und Endmontage Soll-Funktionen	4 Tage	Fre 02.07.21	Mit 07.07.21	16;18
20		Soll-Funktionen implementiert	0 Tage	Don 08.07.21	Don 08.07.21	19
21		~~Entwicklung von Nice-to-have-Funktionen~~	~~8 Tage~~	~~Fre 09.07.21~~	~~Die 20.07.21~~	~~20~~
22		~~Glaserkennung~~	~~3 Tage~~	~~Fre 09.07.21~~	~~Die 13.07.21~~	
23		~~Getränk ausschenken~~	~~3 Tage~~	~~Mit 14.07.21~~	~~Fre 16.07.21~~	~~22~~
24		~~Spielmodi/Optionen~~	~~3 Tage~~	~~Fre 16.07.21~~	~~Die 20.07.21~~	
25		**Finale Baugruppenmontage**	**4 Tage**	**Don 22.07.21**	**Mit 28.07.21**	**20**
26		Finalisierung Roboter	4 Tage	Don 22.07.21	Die 27.07.21	
27		Abgabe Roboter	0 Tage	Mit 28.07.21	Mit 28.07.21	26
28		**Dokumentation**	**50 Tage?**	**Don 27.05.21**	**Mit 04.08.21**	
29		Vorbereitung Präsentation	4 Tage	Don 08.07.21	Die 13.07.21	20
30		Präsentation	0 Tage	Mit 14.07.21	Mit 14.07.21	29
31		Grobfassung Doku	34 Tage	Don 27.05.21	Die 13.07.21	
32		Finalisierung Doku	5 Tage	Mit 14.07.21	Die 20.07.21	31
33		Abgabe Doku 1	0 Tage	Mit 21.07.21	Mit 21.07.21	32
34		Korrektur Doku	4 Tage	Mit 21.07.21	Mon 26.07.21	33
35		Abgabe Doku 2	0 Tage	Mit 04.08.21	Mit 04.08.21	34

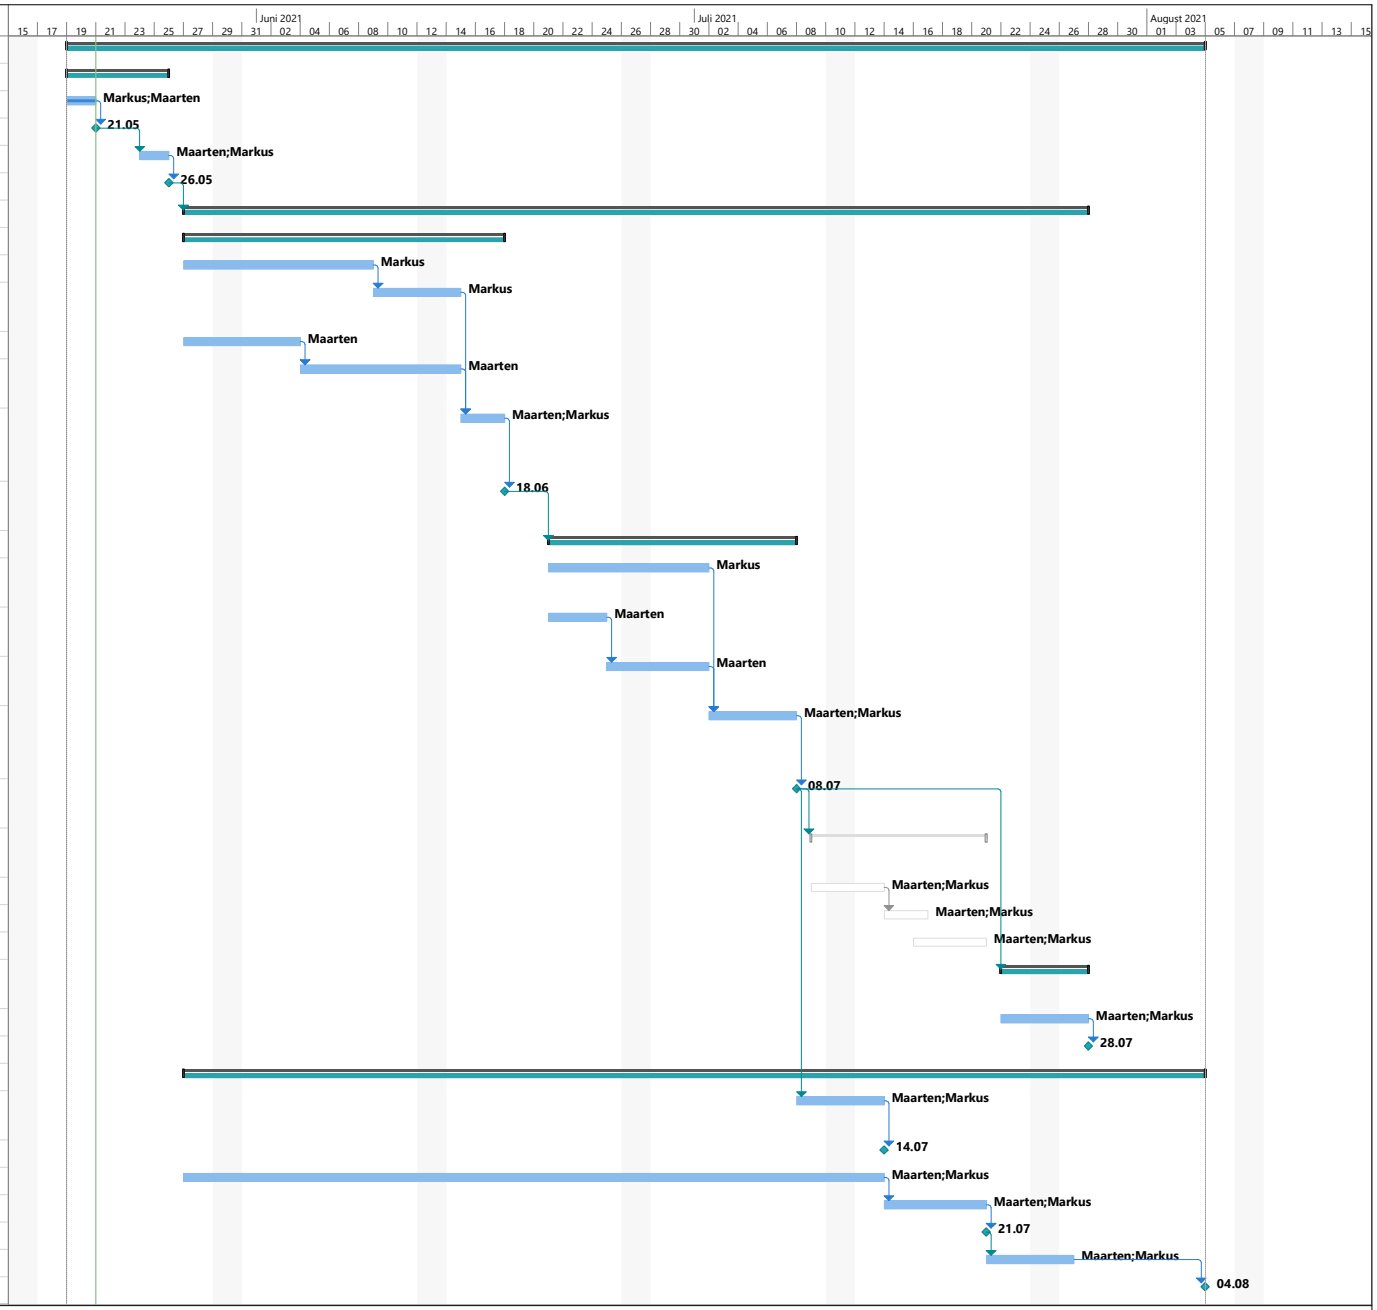

Projekt: Gantt-Diagramm
Datum: Fre 21.05.21

Vorgang	Sammelvorgang	Inaktiver Meilenstein	Nur Dauer	Nur Anfang	Externer Meilenstein	Manueller Fortschritt
Unterbrechung	Projektsammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelrollup	Nur Ende	Stichtag	
Meilenstein	Inaktiver Vorgang	Manueller Vorgang	Manueller Sammelvorgang	Externe Vorgänge	In Arbeit	
